机柜量尺与交付信息模板

版本: v1.1 · 生成时间: 2025-10-14 02:48

一、客户与现场信息

公司名称	联	系人		电话	
项目地址	现均	场类型	机房/办公区/弱电间/户外	同城安都	長是 / 否
期望交付	允	许入场时	讨问	楼层/电	梯

二、机柜参数(可多选)

高度(U)	12U	27U	42U	其他
宽度(mm)	600	800	其他	
深度(mm)	600	800	1000/1100	其他
门型	玻璃门	网门	百叶/实门	其他
颜色	黑 RAL9005	灰 RAL7035	其他	


三、现场量尺(单位:mm)


门宽	门高		走廊宽	
电梯厢长	电梯厢宽		电梯门宽	
机位净宽	机位净深		净高	
地面承重	是否有地插	是/否	接地条件	

四、配件与安装选项


托盘	固定/抽拉/数量:	理线	环/走线架	挡板	上/下/侧
PDU	10A / 16A / 位数:	风扇	数量:	温湿度	是/否
门禁	机械锁/指纹/刷卡	接地线	长度:	标签打印	是/否

五、尺寸示意图(工程示意)

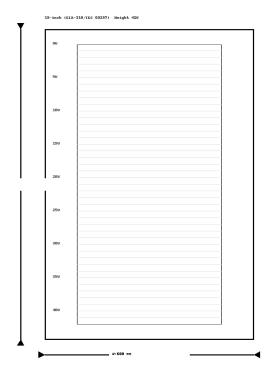




270 Rack 600x800 - Engineering Sketch

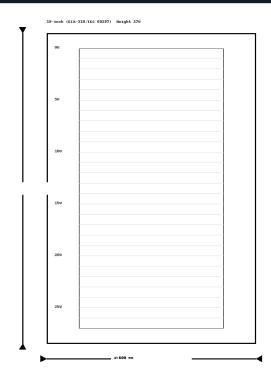




六、更多示意与备注

120 Wall Cabinet 1P54 - Engineering Sketch

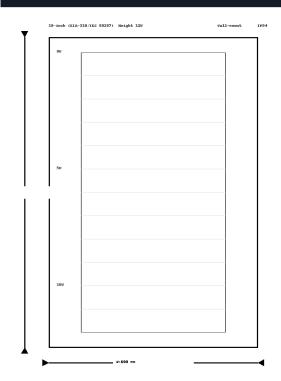



备注:

七、勘测与验收清单(勾选)

机柜位置与数量确认

入场通道与电梯测量

接地可行与接地电阻检测

风道方向与封板计划

PDU/风扇安装位确认

端口对照表字段确认(房间-机柜-U位-设备-端口)

安装拍照留痕(前/后门、铭牌、接地、理线、PDU、风扇)

风险清单与回滚预案

客户确认签名:	日期:
台, MI以业口。	⊔ ∺ Л •
